



INFORME SEMANAL DE TAREAS

SEMANA DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN DE
OBRAS RURALES



OLAVARRÍA
MUNICIPIO

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.

Esta semana se realizaron varias tareas, que si bien el tiempo acompaña, siguen existiendo lugares con exceso de humedad que dificulta algunas actividades. El ritmo de trabajo fue intenso, se desdoblaron varios equipos por zona, entendiéndose que hay que aprovechar esta ventana de buen tiempo hasta la próxima semana que se observan algunas precipitaciones.

Como dato relevante, se espera que la próxima semana inicien las actividades los equipos que fueron licitados en el mes de agosto. (2 zonas con alquileres de equipo para reparación y bacheo y una zona con alquiler de camiones para el transporte de material.)

Además, se anunció que ya tiene fecha de apertura la licitación prevista para el mantenimiento de alcantarillas, que será el 1 de octubre, previendo que nos espera el verano por delante, donde favorece el clima para el desarrollo de estas actividades.





MOTONIVELADORA 2: Este equipo continuó con las tareas de reconformado del camino 078-13 (Recalde – Ruta 226). La inspección noto importantes daños posteriores a las precipitaciones de la semana anterior, por lo cual se decidió intervenir solo en las partes afectadas. Además, se realizaron tareas en el camino 78-2-63 (Los Cerrillos) hasta la estancia la Lidia. Se espera poder trabajar la próxima semana en la zona, realizando tareas de reconformado en ese camino y en los demás transversales.





TAREAS ADICIONALES EN LA ZONA:

A lo largo de la semana continuaron las tareas de bacheo en el camino 078-06 (La Montañesa), Donde desde la semana pasada contamos con una retroexcavadora sobre orugas, para dar tratamiento a pantanos existentes en puntos centrales del camino. Se espera continuar trabajando allí hasta la próxima semana.






ZONA 2

- EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

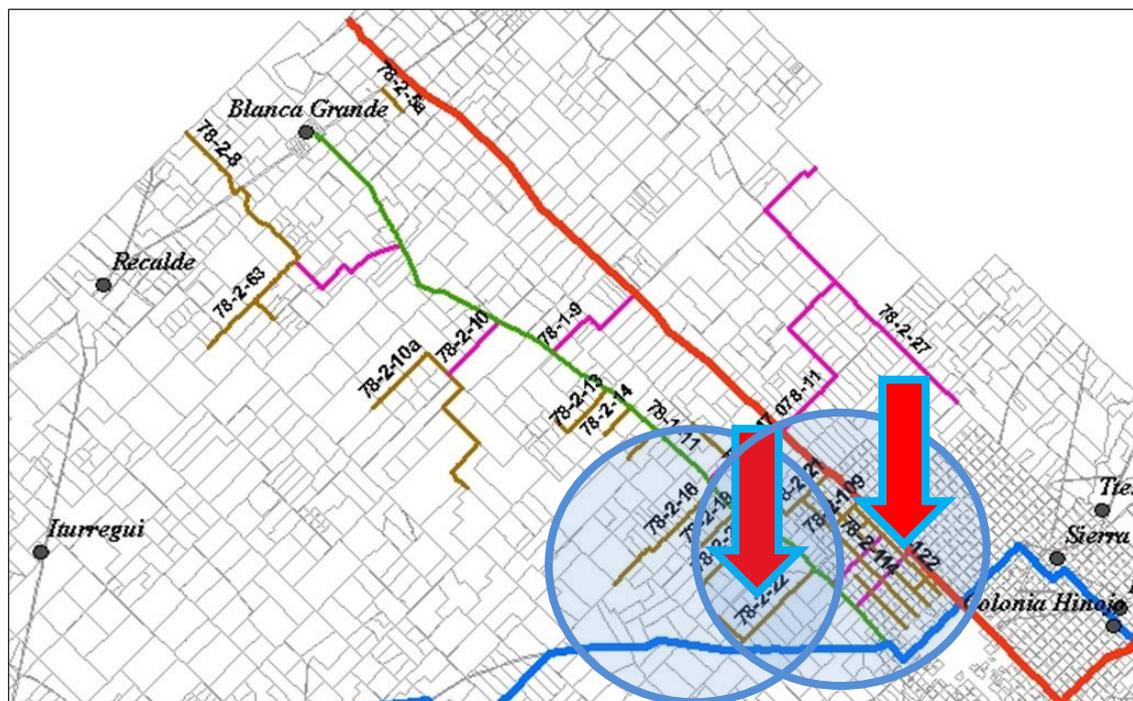

MOTONIVELADORA 1: Esta semana se realizaron tareas de bacheo y reconformado con este equipo, cerca del radio del casco urbano. Sobre el inicio de la semana se concluyeron las tareas de reconformado en el camino 78-2-22 (La Payanca) donde se espera la próxima semana poder aportar algunos viajes en partes que fueron reconformadas. Además, se trabajó sobre el camino 78-2-110 (Prolongación Av., avellaneda, desde cruce con ruta 60 hasta prolongación camino de crotto.) Hoy viernes se está trabajando en la prolongación de Av. Del valle, en conjunto con un camión aportando material para sanear distintos pantanos.




MOTONIVELADORA 2: Este equipo también se encuentra en la zona de chacras próxima al casco urbano. Durante esta semana se trabajó sobre el camino 78-3-149 (Calle Errecart, desde Pellegrini hasta cruce con Frontera Sur). Allí además se aportó material estabilizado 0-20 proveniente de Canteras Piatti, con la batea municipal. Posteriormente se trabajó en el camino 78-2-123 (Prolongación camino de Crotto), donde se aportaron 8 viajes de tosca con camiones de la misma empresa. Actualmente se está trabajando en el camino 78-2-117 (Km 308 Rn226), donde se continúa aportando material para mejorar el acceso a la escuela N° 18.



ZONA 3

- EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

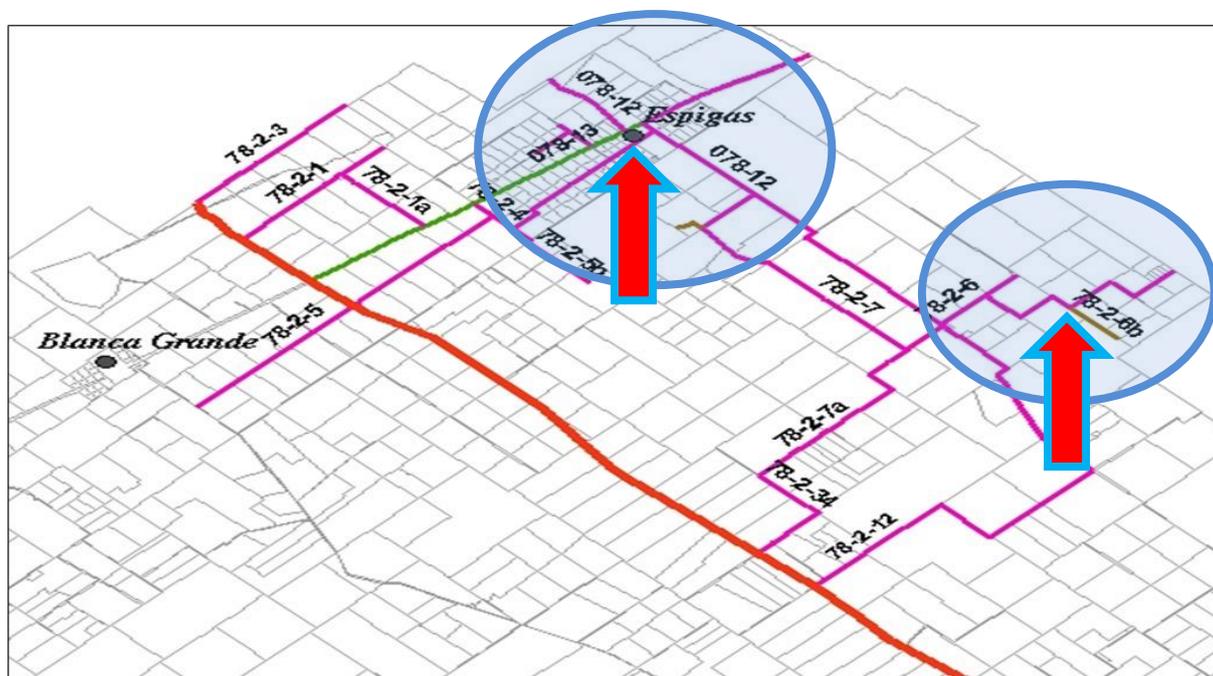

MOTONIVELADORA 1: Este equipo continuo con las intervenciones parciales en toda la zona 3, en la localidad de Espigas y alrededores. Se fueron haciendo intervenciones puntuales en varios caminos, y en inmediaciones a la delegación. Esta semana puntualmente se trabajó sobre el acceso a espigas (camino 078-13), incluyendo el tramo hacia San bernardo y también el tramo hasta el desvío de Laguna Blanca Grande. Además, se intervino el camino 78-2-65 que da acceso a la propia laguna.

El día de hoy, está trabajando sobre la traza del camino 078-12 (a la altura de la escuela N° 47). Se espera la próxima semana poder intervenir la zona de los lagartos, las rosas, el combate.




MOTONIVELADORA 2: Este equipo hace 2 semana que se encuentra detenido, ya que se decidió intercambiar horas por retroexcavadora y continuar la obra Rocha – Muñoz tercer tramo, de la cual se dan detalles más adelante en este informe.



ZONA 4

- ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES y una motoniveladora de la empresa Sacchi Rubén Horacio.


DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

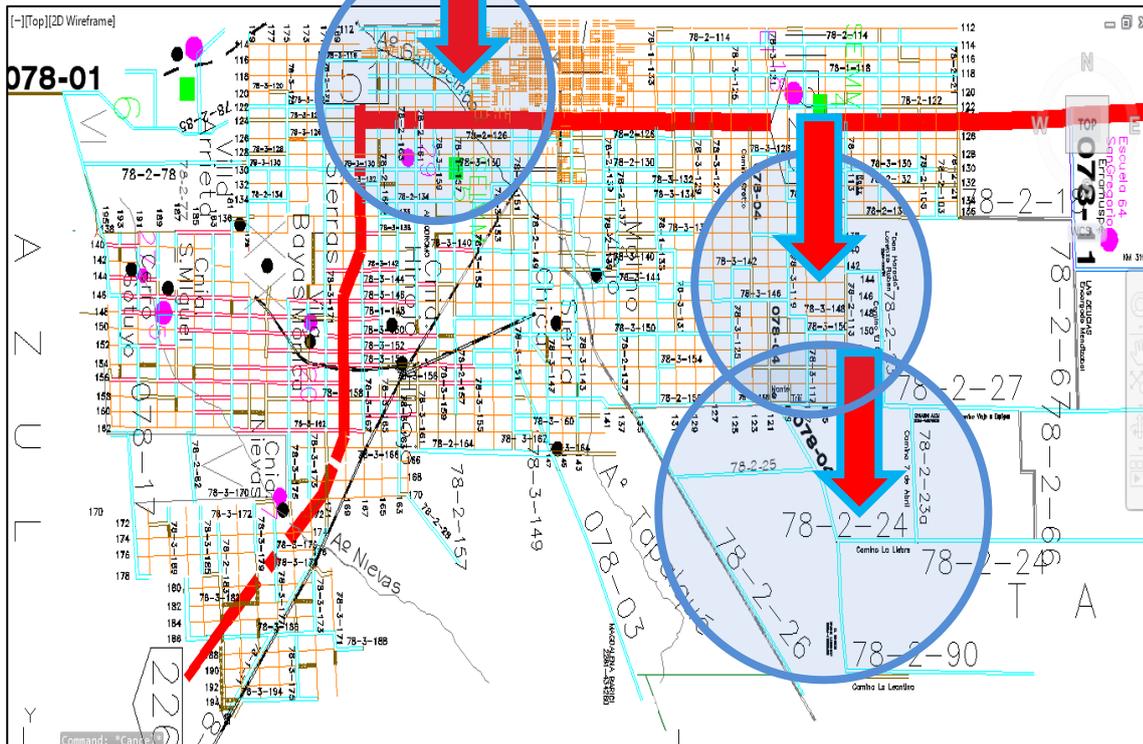

MOTONIVELADORA 1: Este equipo retomó las actividades en la zona del camino 078-04 (Camino de Crotto). A lo largo de esta semana se pudo llegar hasta el límite del partido con Tapalqué, y se ingresó en el camino 78-2-90 (La leontina) a realizar algunas tareas puntuales. Además, se aportó material en el camino 78-3-150 y se reconfirmó de manera parcial. Hoy viernes, se aportó material en el camino 78-2-24 (la liebre) a metros de la intersección con el camino de crotto. Se espera la próxima semana poder continuar con las intervenciones en la zona. y avanzar hacia camino viejo a espigas.



MOTONIVELADORA 2: Este equipo en inicios de la semana se trasladó al galpón para realizarle tareas de mantenimiento (Cambios de aceite y filtros, incluido aceite de transmisión). Allí se detectó una falla cuando Salió a trabajar, producto de un exceso de presión, que ya se está reparando, por lo cual solo se llegó a intervenir el camino frontera Sur.

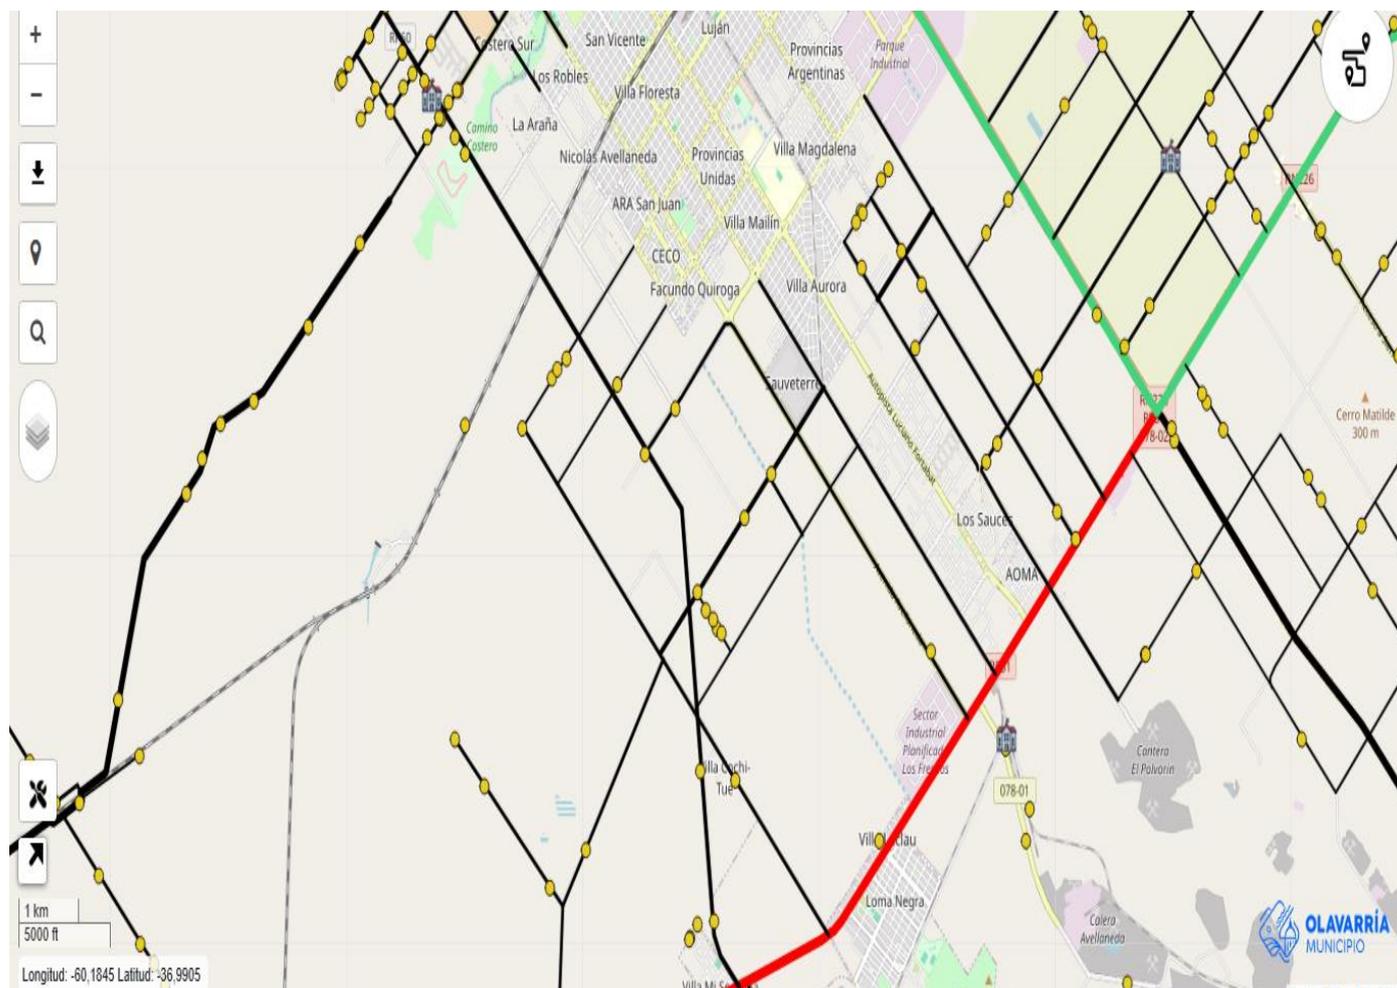

MOTONIVELADORA 3 (Empresa):

Este equipo a lo largo de la semana estuvo realizando tareas de mantenimiento y reconformado del camino 78-2-26. Allí se restituyó el perfil transversal del camino en las partes más complejas, y se aportó material estabilizado 0-20 con la batea municipal. (15 viajes). Se espera el día lunes terminar con estas actividades, y desplazar el equipo para continuar las tareas en la zona próxima a estación Nieves.

Además, se está reconformando de manera parcial el camino 78-2-137 (Prolongación Av. Alberdi).





RETROEXCAVADORA MUNICIPAL: Este equipo continuo en la zona próxima a 16 de julio, puntualmente al camino 78-3-37 con el objetivo de concluir las tareas iniciadas antes de las grandes precipitaciones. Con el correr de las semanas se irán informando los avances de obra.

A lo largo de esta semana se pudo trabajar en los cortes más grandes del camino 78-2-36. Allí contamos con el apoyo de una de las motoniveladoras de zona 6 y de un camión de la empresa ANCAT.

Puntualmente la retroexcavadora municipal está cargando el camión con la tosca previamente extraída semanas atrás, y dando apoyo en el desbarre de los pantanos. Estas tareas son complejas, pero se espera que con el correr de los días se restituya totalmente la transitabilidad en la zona.






ZONA 5

EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA:

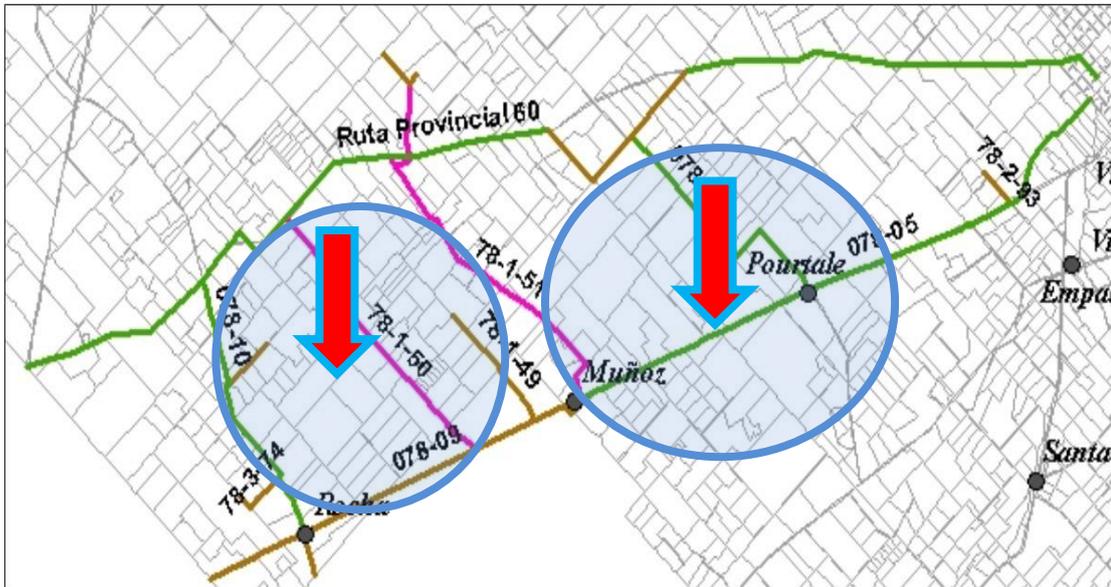

MOTONIVELADORA 1: Este equipo a lo largo de la semana se fue moviendo por distintos puntos de la zona en los cuales se podía trabajar. Se intervino el camino 78-05 en distintos tramos, entre Muñoz y Pourtalé y entre Muñoz y rocha (Zona Obra). Como tarea adicional se comenzó a desparramar la tosca extraída en el camino 78-2-50 (Torres). También se intervino en forma parcial el camino 078-08 (Acceso a Muñoz desde Ruta 51). Se espera la próxima semana seguir trabajando en la zona.



EQUIPO ADICIONAL EN LA ZONA: OBRA MUÑOZ ROCHA (Tercer Tramo)

Semanas atrás iniciaron las tareas en un sector del camino 078-05 (Muñoz Rocha). Recordamos que hace algunos años se había realizado la obra que abarcaba dos tercios de este tramo, por lo que el tercio restante que quedó sin intervenir y trajo algunas complicaciones con las intensas precipitaciones de principio de año. Es por esto que se decidió avanzar con la obra de mejoras, y hacerlo con intercambio de horas de mantenimiento.

El objetivo consiste en garantizar el correcto escurrimiento del agua y canalizarla hacia los puentes existentes. Además, se altea la traza del camino con tosca para mejorar la circulación. Por el momento solo interviene como equipo adicional la retroexcavadora, y contamos con un avance semanal de 500 metros.

En este apartado se irán mostrando los avances, y se mencionará la intervención de los demás equipos.



Esta semana el equipo estuvo inactivo, producto de un robo que sufrió la empresa en un campo de la zona. allí no solo les robaron el combustible, sino que también rompieron vidrios del equipo y se dañó la zona de comandos y pantallas. Se espera que este equipo este operativo este lunes próximo.


Se recuerda circular con precaución en la zona, y tratar de prever los movimientos de camiones en función al desarrollo de la obra, es decir, en muchos tramos la calzada se ve reducida por el acopio de material, lo cual restringe movimientos de equipos pesados.



ZONA 6

EMPRESA CONTRATISTA: SACCHI VIAL

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS POR ZONA:

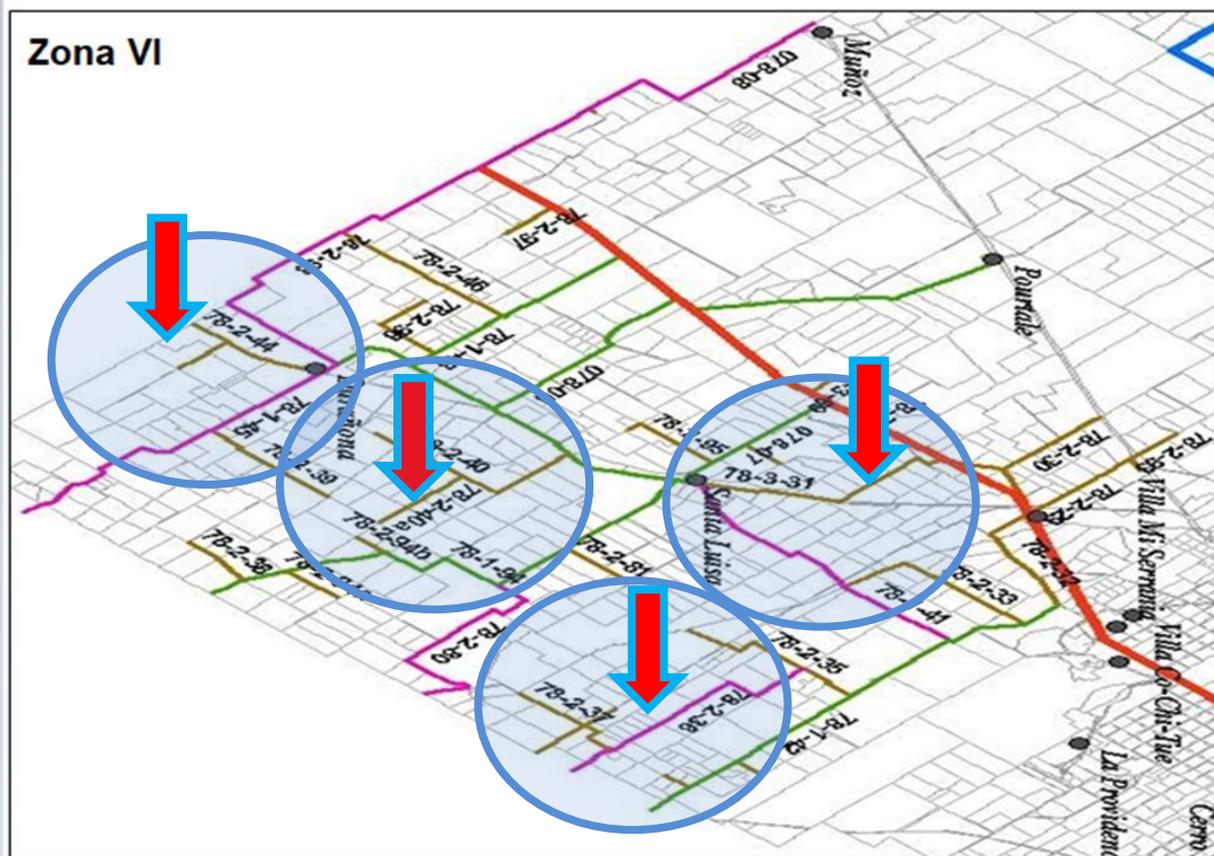

MOTONIVELADORA 1: Desde la semana pasada, este equipo se desdobló y comenzaron a atacarse varios frentes complicados de esta zona. Se intercambiaron horas de equipo y se dispuso de un plan de trabajo para abordar los pantanos existentes en el camino 78-3-40 (la Totora). Allí se cuenta con una retropala, un camión volcador y la batea municipal aportando material estabilizado. Se trabajó toda la semana y se espera mañana sábado culminar las actividades, garantizando la transitabilidad en la zona.

Se evaluará la próxima semana si se continúa con el bacheo en la zona, o se vuelve a los trabajos de reconformado con motoniveladora





MOTONIVELADORA 2: Este equipo continuo en la zona próxima a 16 de julio. Allí se intervinieron los caminos 78-2-36 (San Francisco – La Elisa) y 78-2-37 (El perdido – Tirador), en conjunto con retroexcavadora municipal y los equipos de alcantarillas. Se aportó material en los lugares necesarios con presencia de equipos adicionales de la empresa, resultando muy dificultosas las tareas debido a la gran cantidad de agua presente en el lugar. Se está trabajando de manera integral en la zona, con un mix de equipos que pretende dar solución a las distintas problemáticas.





EQUIPOS ADICIONALES EN LA ZONA: Esta semana este equipo adicional está trabajando en el camino 078-06 (Pourtalé – Ruta 60), realizando tareas de desbarre y saneamiento de pantanos, en conjunto con un camión volcador. Se espera poder terminar con el aporte de material en la zona para luego dar intervención con la motoniveladora de la zona.





TAREAS ADICIONALES EN LA ZONA:

Como se pudo observar desde hace un tiempo, comenzaron las tareas preliminares para la ejecución del cuarto parque eólico en el partido de Olavarría, emplazado en la zona de media estación Pourtalé.

La empresa a cargo de las tareas puertas adentro del predio es PCR, subcontratando a COARCO para los movimientos de suelo.

Hace algunas semanas se llevó a cabo una reunión entre municipio y PCR, a fin de plantear los lineamientos de trabajo y exigir a dicha empresa la documentación correspondiente para llevar adelante la obra (Entre ellos plan de mejora de caminos, estudio hidráulico integral de la zona de trabajo, etc.)

Además, como parte de las acciones coordinadas, la empresa comenzó con los trabajos hidráulicos básicos para lograr un correcto escurrimiento del agua. Para ello se dispuso la limpieza de cunetas, sobre ambas márgenes del camino 78-05 (Olavarría – Pourtalé) en la zona próxima al futuro parque.

La empresa puso a disposición inicialmente 6 retroexcavadoras, dos motoniveladoras y varios camiones a fin de restituir rápidamente la transitabilidad en la zona.



EQUIPO ADICIONAL EN LA ZONA:

Recordamos que, desde el inicio de esta nueva licitación de mantenimiento, en el mes de agosto, se decidió incorporar como equipo adicional a zona 6 una retroexcavadora sobre orugas, a fin de ir solucionando los distintos problemas de la red vial. Había comenzado con algunas tareas hidráulicas y de aporte de material en el camino 78-1-41 (Santa Luisa – L´Amalí), y esta semana decidimos momentáneamente y ante las urgencias, dar respuesta a 3 situaciones particulares. La primera de ellas fue a principios de la semana en el camino 78-3-31 (Querandíes – Santa luisa). La segunda actividad se desarrolla en el camino 78-2-39 (Bianucci), actualmente en proceso, y la tercera, ya pensada para la semana entrante, en el camino 078-07 (La Irene).



MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS: Continúan a buen ritmo las tareas de reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas. Para ello se dividió el partido en dos grandes zonas, las cuales están a cargo de la empresa LECON SA.

Actualmente uno de los equipos continúa trabajando en la zona próxima a 16 de julio, mientras que el otro se intercambi6 por una retroexcavadora sobre orugas para hacer obras hidráulicas en el camino 78-3-151 (Unidad 27 – Sierra Chica)

Actualmente en la zona 16 de julio se posicionaron los tubos de todas las alcantarillas que se planificaron mejorar, pero las condiciones climáticas hacen que no se pueda dar continuidad a los trabajos, por lo que esta semana el equipo se vio abocado a realizar tareas de bacheo en la zona para poder transitar con los equipos pesados y materializar correctamente las alcantarillas previstas y sus respectivas tapadas.





De esta manera, la red vial del partido de Olavarría contó esta semana con 11 motoniveladoras, 6 retroexcavadoras, 3 retropalas y 5 camiones volcadores.

Como siempre, cabe aclarar que hay sectores de la traza de un camino que no se intervendrán en tanto y en cuanto la inspección lo crea conveniente, dependiendo de su estado.

Se apela a la responsabilidad de los usuarios de la red vial que se evite circular en días de lluvia o posteriores, respetando la ordenanza 3684/14 vigente, así entre todos evitamos daños en caminos primarios, secundarios y terciarios.

La dirección queda abierta a sugerencias y atenta siempre a las reflexiones que puedan surgir en cuanto a disposición de equipos o realización de tareas, a fin de garantizar la eficiencia de recursos. Además, se recuerda que ante reclamos se puede concurrir a la oficina de obras rurales en el Municipio, o bien comunicarse telefónicamente, donde alguien de nuestro equipo lo atenderá y nos pondremos en contacto para abordar la problemática.

Saluda atte.

ING. Mariano Arrignon

DIRECTOR DE OBRAS RURALES

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

OLAVARRIA, 29 de agosto de 2025.
