




INFORME SEMANAL DE TAREAS

SEMANA DEL 6 AL 18 DE JULIO



DIRECCIÓN DE
OBRAS RURALES



OLAVARRÍA
MUNICIPIO

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.

A lo largo de este periodo se puede ver gran cantidad de equipos mejorando la transitabilidad en los distintos focos de conflicto de la red vial. Se trabajo de manera continua, con algunas intermitencias producto de las precipitaciones, que, si bien no se observaron grandes milimetrajes, en sectores puntuales complicaron en normal desarrollo de las actividades.

Por otro lado, continúan a buen ritmo las obras licitadas con anterioridad, de las cuales se van a ir informando los avances en los distintos apartados.


Como dato adicional, ya está la fecha fijada del acto de apertura de ofertas para las nuevas licitaciones de mantenimiento rutinario de caminos rurales del partido, el día 10 de agosto del corriente. Tal cual lo conversado en las últimas reuniones con mesa agropecuaria, una vez definidas las empresas adjudicatarias, se brindará la capacitación anual de buenas prácticas de mantenimiento de caminos, dictada por el personal de la dirección de obras rurales del municipio.



ZONA 1


- EMPRESA CONTRATISTA: Ancat SA

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

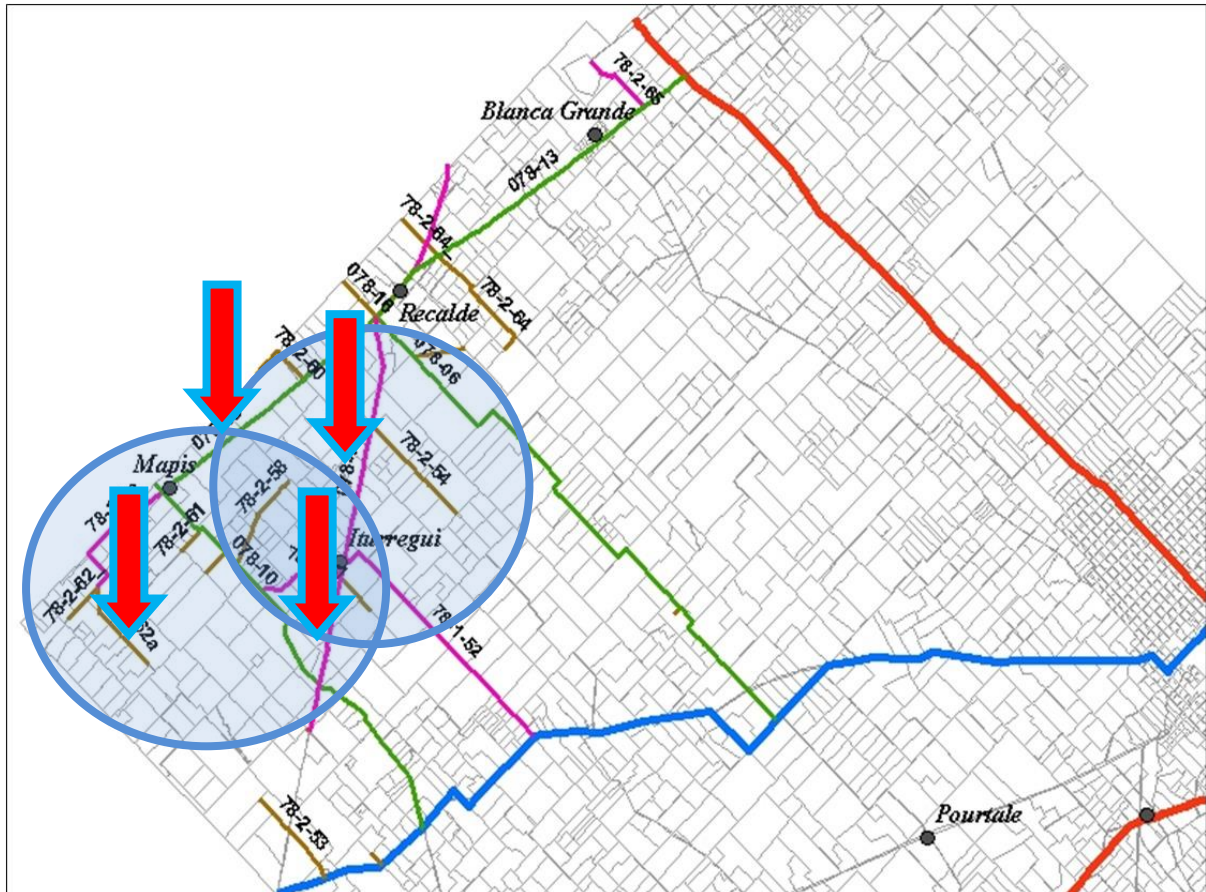

MOTONIVELADORA 1: Este equipo a lo largo de este periodo estuvo desafectado de las tareas de mantenimiento, a fin de cumplir con el intercambio de horas de equipos adicionales. (intercambio por retroexcavadora y camiones en la zona de Santa Dominga). No obstante, la empresa encargada de mantenimiento, que es la misma adjudicataria de la obra Recalde – Iturregui, la dispuso a realizar tareas afectadas dicha obra, por lo que se ve trabajando en la zona.

MOTONIVELADORA 2: Este equipo a lo largo de este periodo realizó tareas en distintos puntos de la zona. La semana pasada, se trabajó sobre los caminos 78-2-64 (Las coloradas) y camino 78-2-8 (Los cerrillos). En ambos puntos, se está trabajando muy al límite con respecto a la humedad existente en banquetas y cunetas. Ya sobre esta semana, se trasladó el equipo a Mápis, donde se intervino el camino 078-10 (De Mápis hacia el límite del partido) y el camino 78-2-62 (Desde Mápis hacia La Ramona). En este último camino se terminaron las tareas de bacheo. Se espera la próxima semana continuar los trabajos en la zona.

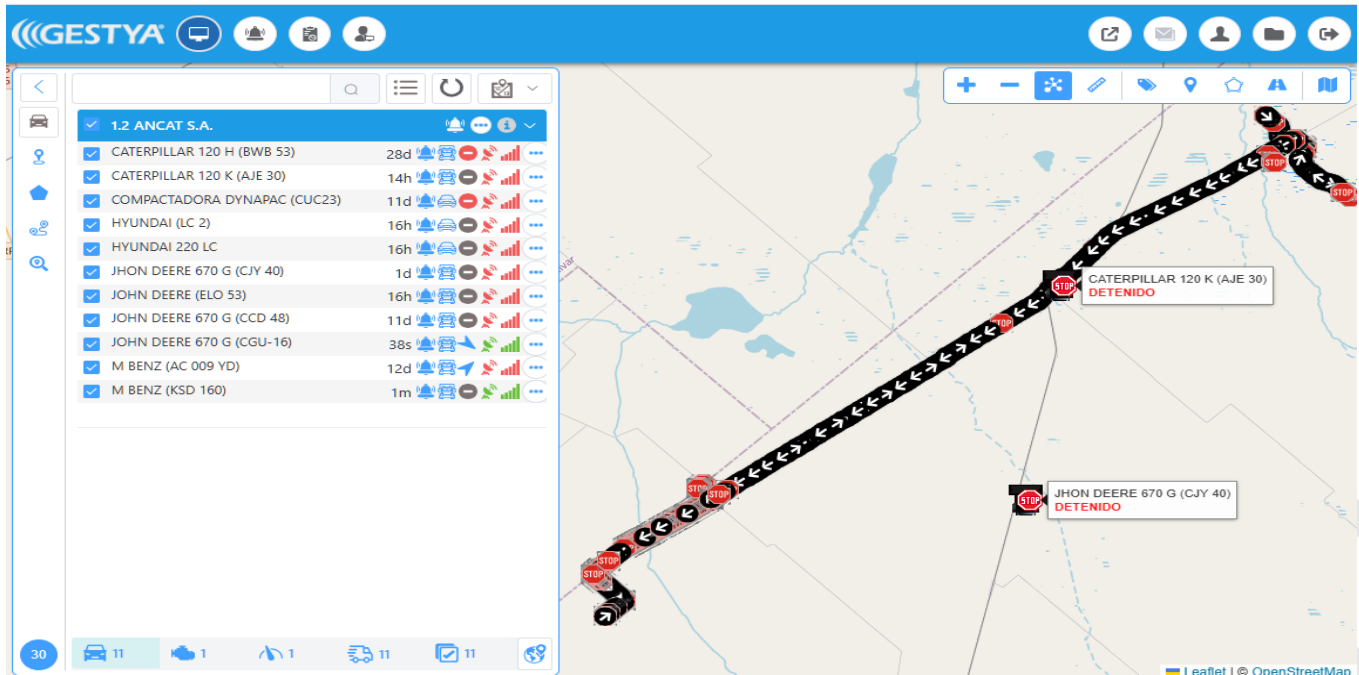

TAREAS ADICIONALES EN LA ZONA:

En este apartado se irán mostrando los avances en distintos puntos de la zona en donde se comenzó a trabajar con el equipo tercerizado, cuya adjudicación corresponde a la licitación pública mencionada en informes anteriores.

El municipio cuenta con 500 horas de retroexcavadora sobre orugas, 400 horas de motoniveladora, 500 horas de camión volcador y 200 horas de compactador autopropulsado.

El plan de trabajo consiste en abordar focos de conflicto en distintos puntos de la zona, priorizando tareas hidráulicas y alteo de caminos. El listado es extenso, por lo que se ira avanzando en los lugares donde se pueda trabajar con comodidad, optimizando los recursos disponibles.

En este periodo, se realizaron tareas de bacheo en el camino 78-2-62 (La Ramona) y posteriormente, se trasladó el equipo al camino 78-3-63 (Guarrochena – Los cerrillos). Allí se está aportando material con la retroexcavadora y el camión, principalmente en los sectores próximos a los vados donde circula el agua.







ZONA 2

- **EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA**

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

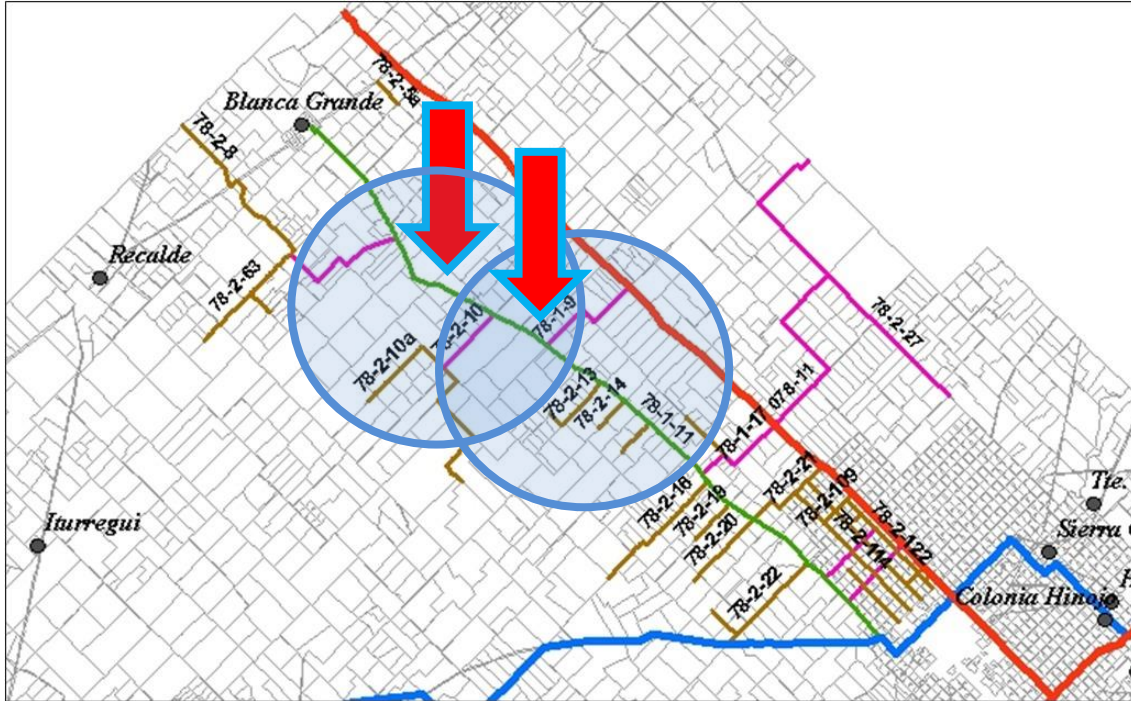

MOTONIVELADORA 1 y 2: Durante este periodo, este equipo trabajo de manera puntual en distintos sectores del camino 78-1-11 (226 vieja) entre Blanca Chica y Santa Dominga. También se intervino el camino 78-2-10 en la zona próxima a La Rinconada. Posteriormente, se trabajó en el camino 78-2-10 en el tramo desde el parque eólico Vientos Olavarria hacia el Biguá. Dicha zona es compleja, al igual que en otros sectores en el suelo está muy saturado, por lo cual las intervenciones son puntuales, y se apunta a borrar las huellas existentes para que el agua de futuras lluvias no quede sobre el camino. Dicho tramo se planea intervenir durante el verano, para lograr altear la traza y realizar trabajos de calidad, y que perduren en el tiempo.

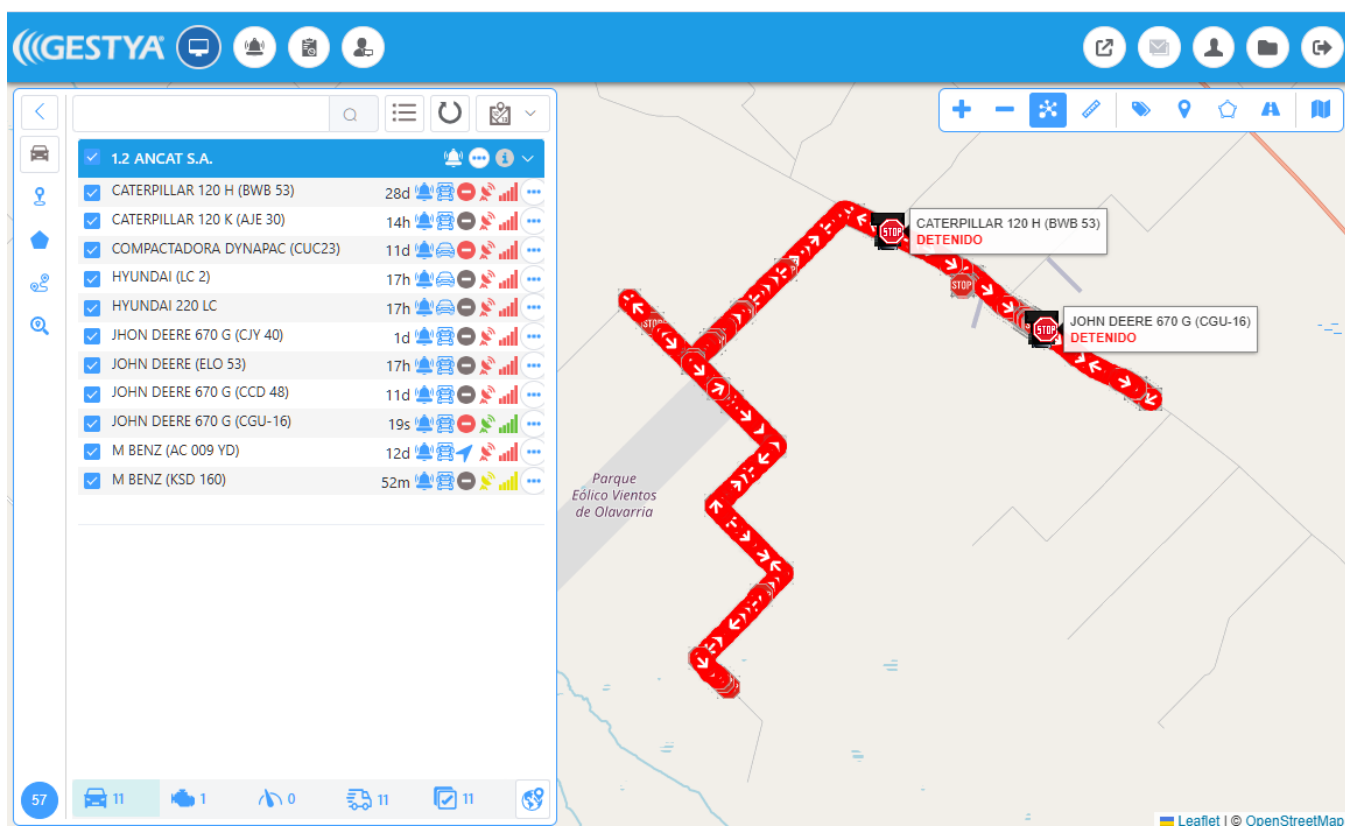


ZONA 3

- EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:



MOTONIVELADORA 1: Este equipo continuo operativo en zona 3 (Espigas). Allí se están realizando diversas tareas de reconformado y perfilado de caminos. Entre los intervenidos en este periodo se pueden mencionar: 078-13 (Acceso a Espigas); 078-12 (Entre Espigas y el A° Las Flores); 78-2-2 (Camino del cementerio); 078-12 (Entre espigas y Escuela N° 47) en sectores puntuales y 078-13 (Entre Espigas y San Bernardo). Se espera la próxima semana trabajar sobre el camino 78-2-3 (Cisneros), y si no se encuentran complicaciones en la zona, se evaluará detener el equipo algunos días.

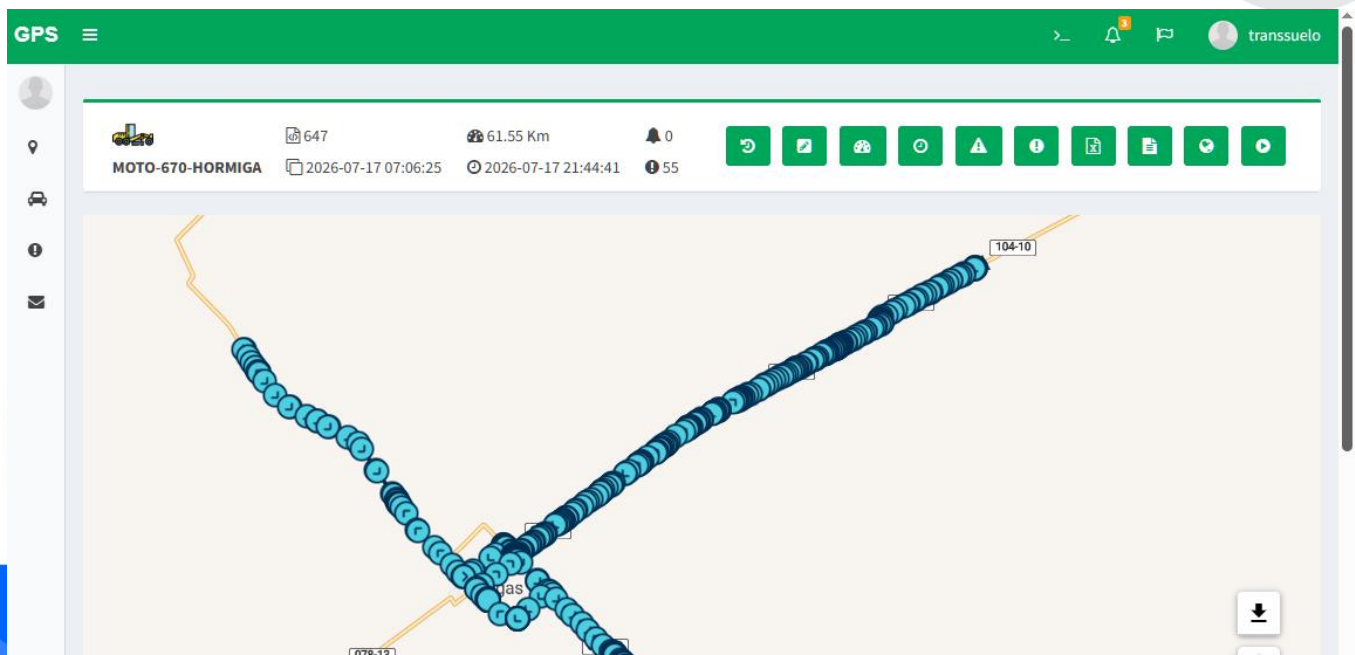


MOTONIVELADORA 2: A lo largo de este periodo, se trabajó en distintos puntos de la zona Hinojo – Colonia Hinojo, a ambos lados de la Ruta Nac. 226. Entre los caminos intervenidos, se puede mencionar la zona de boca Sierra, algunas tareas de reconformado con aporte de material en el camino 78-3-150 (Petachi); camino 78-3-171 (Schwindt) y algunas intervenciones puntuales para la zona de colonia San Miguel. Se espera la próxima semana continuar en la zona.



ZONA 4

- **ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES** y una motoniveladora de la empresa **Sacchi Rubén Horacio**.

DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

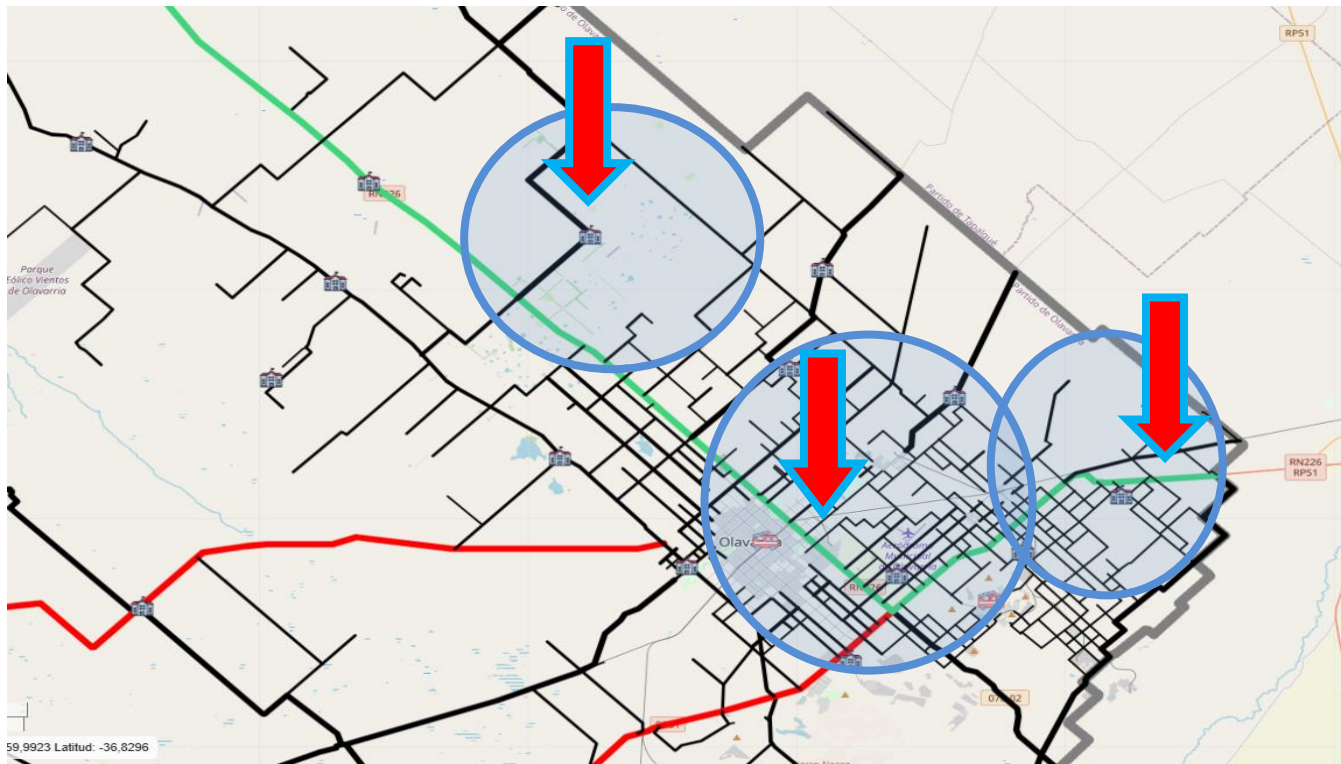

MOTONIVELADORA 1: Este equipo a lo largo de este periodo realizó tareas de reconformado y tendido de material en el camino 78-2-117 (Desde ruta Nac 226 hacia 226 vieja, pasando por la escuela N° 18). Allí días anteriores se trabajó con una retroexcavadora aportando material y conformando las cunetas, y ahora se está desparramando y compactando la tosca. Se espera la próxima semana continuar con estas actividades.





MOTONIVELADORA 2: Este equipo se trasladó hacia el camino 78-2-24 (la Liebre), donde comenzaron las tareas de reconformado. Allí se está trabajando en conjunto con el compactador del municipio, a fin de reconformar y mejorar la zona. Se espera que la próxima semana llegue la retropala para realizar tareas de bacheo en la zona, aprovechando los acopios de tosca realizados durante el verano. Además, se van a limpiar las alcantarillas existentes.



MOTONIVELADORA 3 (Empresa):

Este equipo realizó tareas de reconformado sobre la traza de la ruta 51 vieja, entre colonia San Miguel y colonia Nievas. Además, realizó intervenciones puntuales sobre la zona de chacras entre Hinojo y el límite con el partido de azul.



RETROEXCAVADORA MUNICIPAL: Este equipo continuo las tareas hidráulicas en el camino 078-05, puntualmente en la zona de media estación Pourtalé. Allí se detectaron ahuellamientos producto de un deficiente escurrimiento hidráulico, por lo que se están interviniendo las cunetas (Inexistentes en partes) a fin de garantizar el escurrimiento. Se espera continuar las tareas en la zona la próxima semana, y mejorar algunas pasadas de alcantarillas. Además, se aportó material estabilizado para mejorar la transitabilidad de la zona.

A lo largo de este periodo, continúan las tareas de remoción de material producto de la limpieza de las cunetas para mejorar el escurrimiento. A su vez, se está extrayendo tosca y se acopia a fin de continuar con las tareas de bacheo.





RETROPALA MUNICIPAL: Este equipo estuvo detenido algunos días por problemas eléctricos. Ya está en funcionamiento y se espera el traslado al camino de la liebre, a fin de realizar tareas de bacheo con material acopiado y limpieza de alcantarillas existentes.



ZONA 5

EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES

DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA:




MOTONIVELADORA 1: Este equipo realizó algunas tareas de reconformado en el camino 078-06 (Pourtalé – ruta 60), tal cual lo anunciado en el informe anterior. Actualmente se encuentra detenido con problemas mecánicos, pero la próxima semana se espera que este operativo nuevamente.



ZONA 6

EMPRESA CONTRATISTA: SACCHI VIAL

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS POR ZONA:

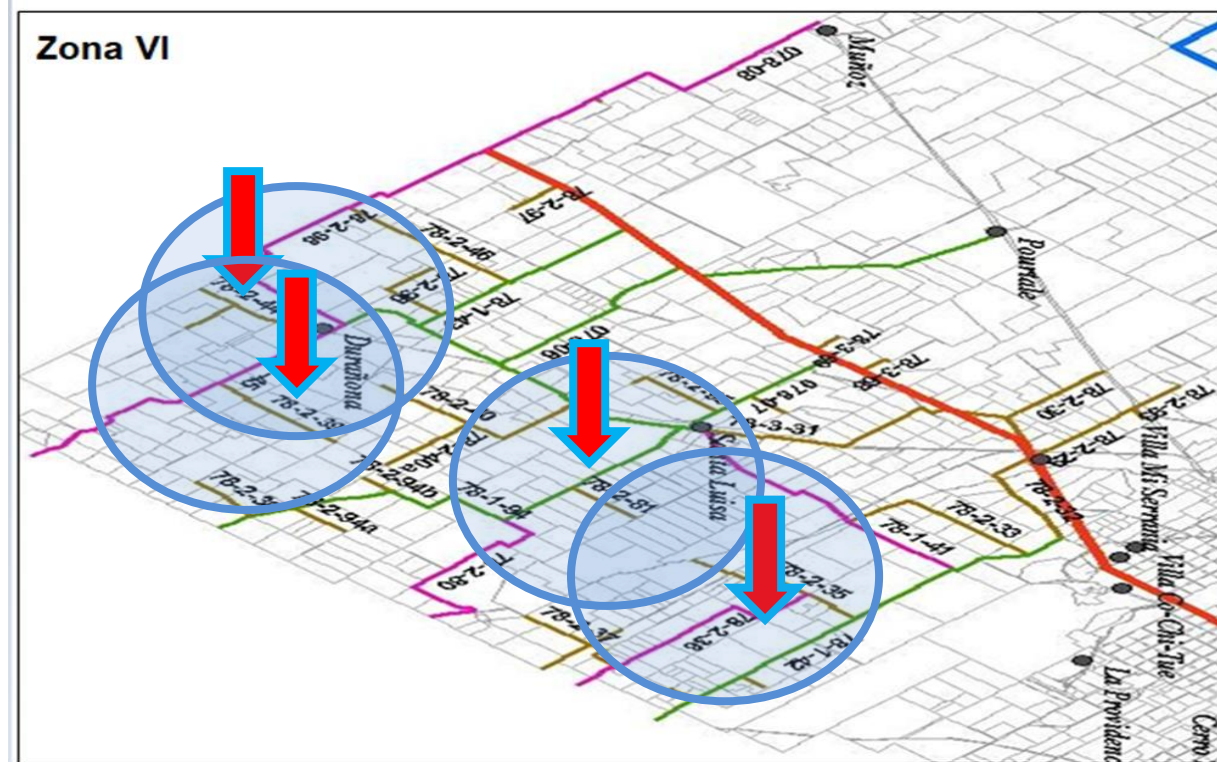

MOTONIVELADORA 1: Este equipo, estuvo algunos días detenido por lluvias, y luego se trasladó a la zona de Estación Durañona. Allí se realizó la intervención del camino hacia el luchador, en las partes ahuellados y el camino de Bianucci. Además, se trabajó en algunos pantanos en la calle angosta a 16 de Julio.



MOTONIVELADORA 2: Este equipo continuo las tareas de reconformado y aporte de material en el camino 78-1-94 (Santa Luisa – La Unión). Allí se está trabajando en conjunto con los distintos equipos de la zona para mejorar la transitabilidad. Se espera la próxima semana terminar con las tareas en la zona.





TAREAS ADICIONALES EN EL PARTIDO:

Este equipo se encuentra trabajando en el camino 78-2-10 (La escondida) a fin de realizar tareas de bacheo. Una vez terminadas estas tareas, se espera trasladarse a la zona de Santa Luisa, para limpiar un canal clave en el escurrimiento del agua de la zona.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAS:

ZONA 1: EMPRESA: “San Román Claudia Susana”

En este apartado se detallan las obras ejecutadas por esta empresa en lo que respecta a la licitación vigente de reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas.

A lo largo de esta semana, el equipo realizó diferentes tareas de bacheo en la zona Blanca Grande (Camino de Guarrochena). Allí en conjunto con el otro equipo de la empresa, se está mejorando la transitabilidad en dicho camino, el cual se vio muy afectado durante el invierno pasado y gran parte de este año.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAS:

ZONA 2: EMPRESA: “Sacchi Vial e Hijos”

En este apartado se detallan las obras ejecutadas por esta empresa en lo que respecta a la licitación vigente de reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas.

Este equipo continúa realizando tareas hidráulicas y de bacheo en la zona Santa Luisa – 16 de Julio. Se van haciendo intervenciones puntuales para mejorar tanto el escurrimiento como la transitabilidad.





OBRAS EN MARCHA:

ZONA 5: - CAMINO 78-06 (POURTALE – RUTA 51) - EMPRESA: “PRODUCCIONES INDUSTRIALES”

Hace algunas semanas comenzó la obra de alteo, entoscado y limpieza de cunetas en el camino 078-06. La misma tiene como objetivos la mejora de 6.2 km de camino, el cual es muy utilizado tanto como para una salida segura de la producción como para un acceso transitable al establecimiento educativo de la localidad. Con el correr de los días se irán mostrando avances de la misma, cuyo plazo de finalización es de 3 meses, dependiendo de las condiciones climáticas.

Esta obra está en etapa de finalización, resta medir los espesores del paquete estructural de tosca sobre el camino para verificar que cumpla con las especificaciones del pliego de bases y condiciones.





OBRAS EN MARCHA:

ZONA 5: CAMINO 78-2-50 (ZONA MUÑOZ - ROCHA) - EMPRESA: "PRODUCCIONES INDUSTRIALES"

Otra de las obras que iniciaron en mayo fue la de alquiler de equipos para alteo y entoscado del camino 78-2-50 (Zona Muñoz – Rocha). El mismo estuvo muy afectado durante todo el invierno 2025. Se comenzaron con trabajos de alteo con equipos de mantenimiento de caminos rurales, en los meses de enero y febrero, para luego dar lugar al entoscado que está finalizado. Además, con el remanente de horas de estos equipos se está extrayendo material y trasladando sobre el camino 078-05 en el tramo Muñoz – Rocha.





OBRAS EN MARCHA:

ZONA 6: CAMINO 78-2-35; 78-2-36; 78-2-37 y otros (ZONA próxima a 16 de Julio) - EMPRESA: "ATAK SRL"

Esta obra comprende varios caminos de la zona próxima a 16 de julio. Desde la bajada de la loma alta, hasta los límites del partido tanto con Benito Juárez como con Azul. La misma tiene como objetivos mejorar la transitabilidad, y para ella es sumamente necesario mejorar el escurrimiento hidráulico. Es una obra cuyo presupuesto alcanza los \$226.200.000 y esta su ejecución a cargo de la empresa Atak srl. Se irán mostrando los avances de la misma en este apartado.



OBRAS EN MARCHA:

ZONA 4: CAMINO 78-2-26 (ZONA próxima a Paso López) - EMPRESA: "PRODUCCIONES INDUSTRIALES"

Esta obra comprende un tramo de más de 6 km sobre el camino 78-2-26, zona próxima al paso López y al Feed Lot El rincón. Allí existe un flujo de tránsito muy intenso, asociado a las actividades de la zona, y se pretende dar una mejora importante a la transitabilidad y a la hidráulica en la zona. Para ello se dimensiona la obra que no solo integra el alteo y entoscado de la traza, sino que también hay gran cantidad de tubos de hormigón para colocar, y permitir el correcto escurrimiento del agua. El valor de la misma es de \$110.184.000.



OBRAS EN MARCHA:

ZONA 1: CAMINO 78-06 (Camino de la Montañesa) - EMPRESA: "Vial Namuncurá"

Esta obra comprende un tramo de 8 km entre la estancia "El arroyito" y Don Enrique. Allí el municipio cuenta con horas de equipo para llevar adelante el entoscado de ese tramo, y realizar el bacheo en el entoscado próximo a la ruta 60. Se irán mostrando los diferentes estados de avance en este apartado a lo largo de las semanas.

A lo largo de esta semana, se observan varios equipos trabajando en el lugar. Una retroexcavadora continua con las tareas de extracción de tosca para el camino, mientras la otra, con dos camiones, está realizando el bacheo desde la zona de obra hasta la ruta 60.



OBRAS EN MARCHA:

ZONA 5: CAMINO 78-08 (Acceso a Muñoz) - EMPRESA: "Atak srl"

La semana pasada arrancó esta obra de bacheo que contempla la totalidad del camino, desde estación Muñoz hacia Ruta 51. Allí se dispone de retroexcavadora, camiones, motoniveladora y compactador. El valor licitado por la empresa adjudicataria es de \$44.000.000. Se espera terminar la obra a lo largo de este mes, si las condiciones climáticas lo permiten.





OBRAS EN MARCHA:

ZONA 3: CAMINO 078-12 (Escuela N° 47 – El Porvenir) - EMPRESA: "ANCAT S.A"

Esta semana iniciaron las tareas en el camino 078-12. Esta obra fue pensada y licitada como alquiler de equipos, con el objetivo de entoscar un tramo de 10 km aproximados, desde la escuela N° 47 hacia el camino 78-2-12 (km 335 Lado La Cautiva). Además, con el componente hidráulico de esta obra se mejora el escurrimiento de ambas cunetas en toda su longitud, favoreciendo no solo el entorno de la obra, sino que también las condiciones hidráulicas aguas arriba.

La obra será ejecutada por la empresa ANCAT S.A, por un valor de \$129.540.000.

Como dato adicional, esta obra permitirá el acceso seguro a estudiantes y docentes al establecimiento educativo.

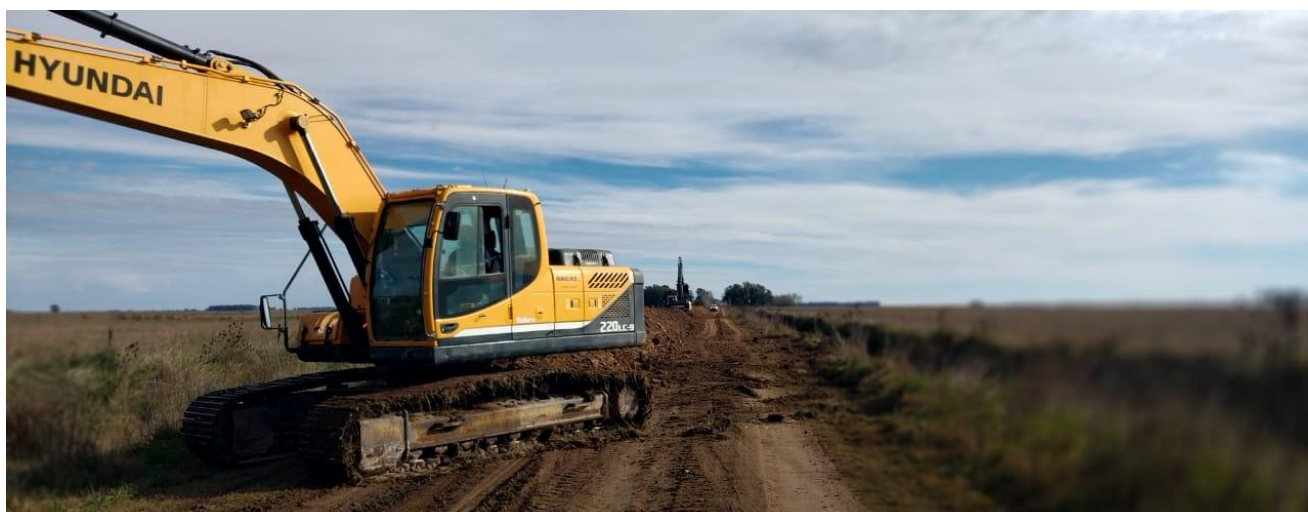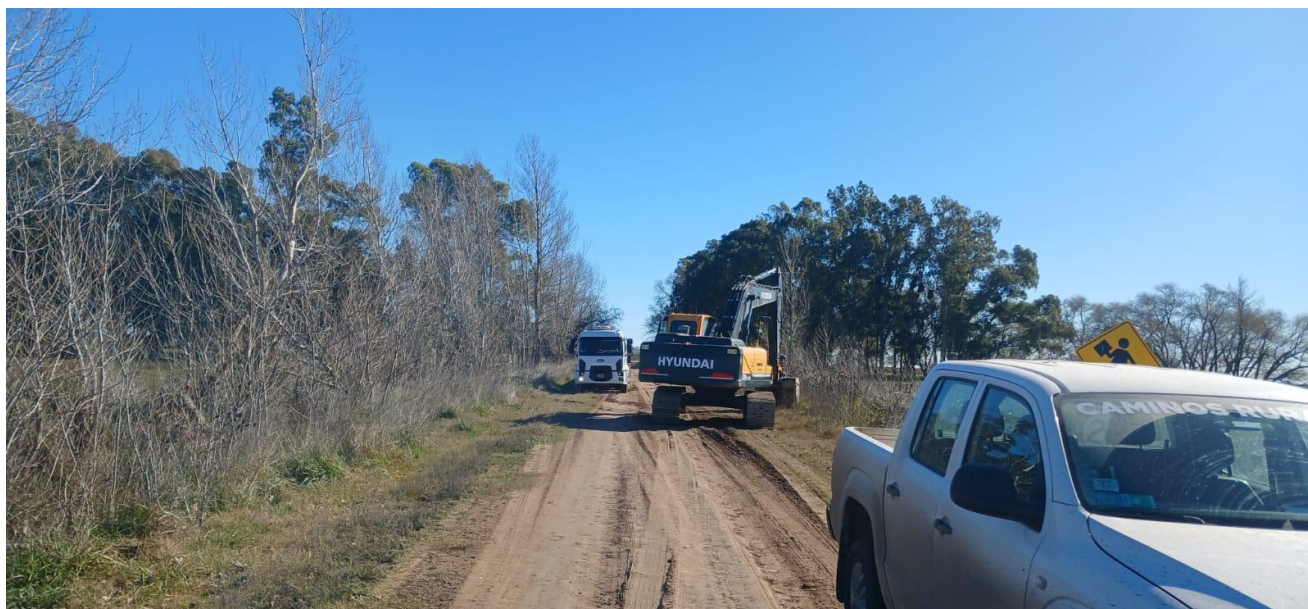

OBRAS EN MARCHA:

ZONA 1: CAMINO 078-14 (Recalde - Iturregui) - EMPRESA: "ANCAT S.A"

Hace algunos días inició la obra del tramo Recalde – Iturregui. Allí se van a intervenir cerca de 10 km de la traza, en sectores donde la inspección, en conjunto con vecinos de la zona, detectan que la transitabilidad se ve restringida.

La obra está siendo ejecutada por la empresa ANCAT S.A, por un valor de \$160.646.500.

Esta obra no solo mejora la transitabilidad de la zona, sino que también tiene un fuerte componente hidráulico, garantizando el escurrimiento del agua gracias a la limpieza y reconformado de cunetas.



De esta manera, la red vial del partido de Olavarría contó esta semana con 19 motoniveladoras (11 de mantenimiento y 8 de obras), 13 retroexcavadoras (1 de mantenimiento y 12 de obras), 3 retropalas, 7 compactadores autopropulsados (1 de mantenimiento y 6 de obras) y 15 camiones volcadores.

Como siempre, cabe aclarar que hay sectores de la traza de un camino que no se intervendrán en tanto y en cuanto la inspección lo crea conveniente, dependiendo de su estado.

Se apela a la responsabilidad de los usuarios de la red vial que se evite circular en días de lluvia o posteriores, respetando la ordenanza 3684/14 vigente, así entre todos evitamos daños en caminos primarios, secundarios y terciarios.

La dirección queda abierta a sugerencias y atenta siempre a las reflexiones que puedan surgir en cuanto a disposición de equipos o realización de tareas, a fin de garantizar la eficiencia de recursos. Además, se recuerda que ante reclamos se puede concurrir a la oficina de obras rurales en el Municipio, o bien comunicarse telefónicamente, donde alguien de nuestro equipo lo atenderá y nos pondremos en contacto para abordar la problemática.

Saluda atte.

ING. Mariano Arrignon

DIRECTOR DE OBRAS RURALES

MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

OLAVARRIA, 22 de Julio de 2026.
