




## INFORME SEMANAL DE TAREAS

**SEMANA DEL 01 AL 10 DE MAYO**

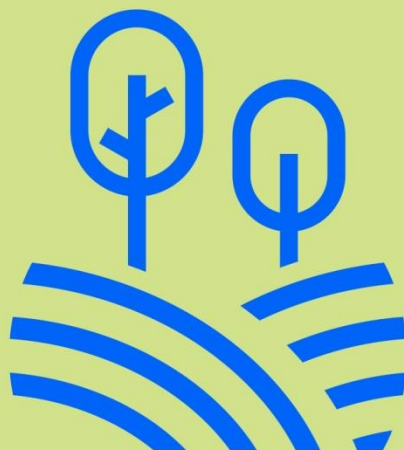

DIRECCIÓN DE  
OBRAS RURALES



**OLAVARRÍA**  
MUNICIPIO

# INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detallan las tareas que se realizaron en la red vial del partido de Olavarría durante la semana en curso, y también se pueden ver en algunos casos, las tareas programadas para las siguientes semanas.

Nuevamente las lluvias son las protagonistas de esta semana, que, si bien no se registraron grandes milimetrajés, complican mucho las tareas en terrenos difíciles, donde hay pantanos que se están trabajando para restituir la transitabilidad del camino.

En distintos relevamientos de esta semana, se observaron caminos que estaban en buenas condiciones, luego de haberlos intervenido, pero la combinación de precipitaciones y tránsito causaron un deterioro que es difícil de reparar.




Apuntamos a la responsabilidad de quienes transitan los caminos rurales, y lograr que se respete la ordenanza 3684/14 que regula el tránsito en días de lluvia y posteriores. Sabemos que los recursos no abundan, y es realmente una lástima volver a intervenir caminos que ya estaban reconfigurados, porque no solo quitamos presupuesto para futuras intervenciones, sino que también no nos permite avanzar con el cronograma estipulado.

## ZONA 1

- **EMPRESA CONTRATISTA:** Ancat SA

### DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

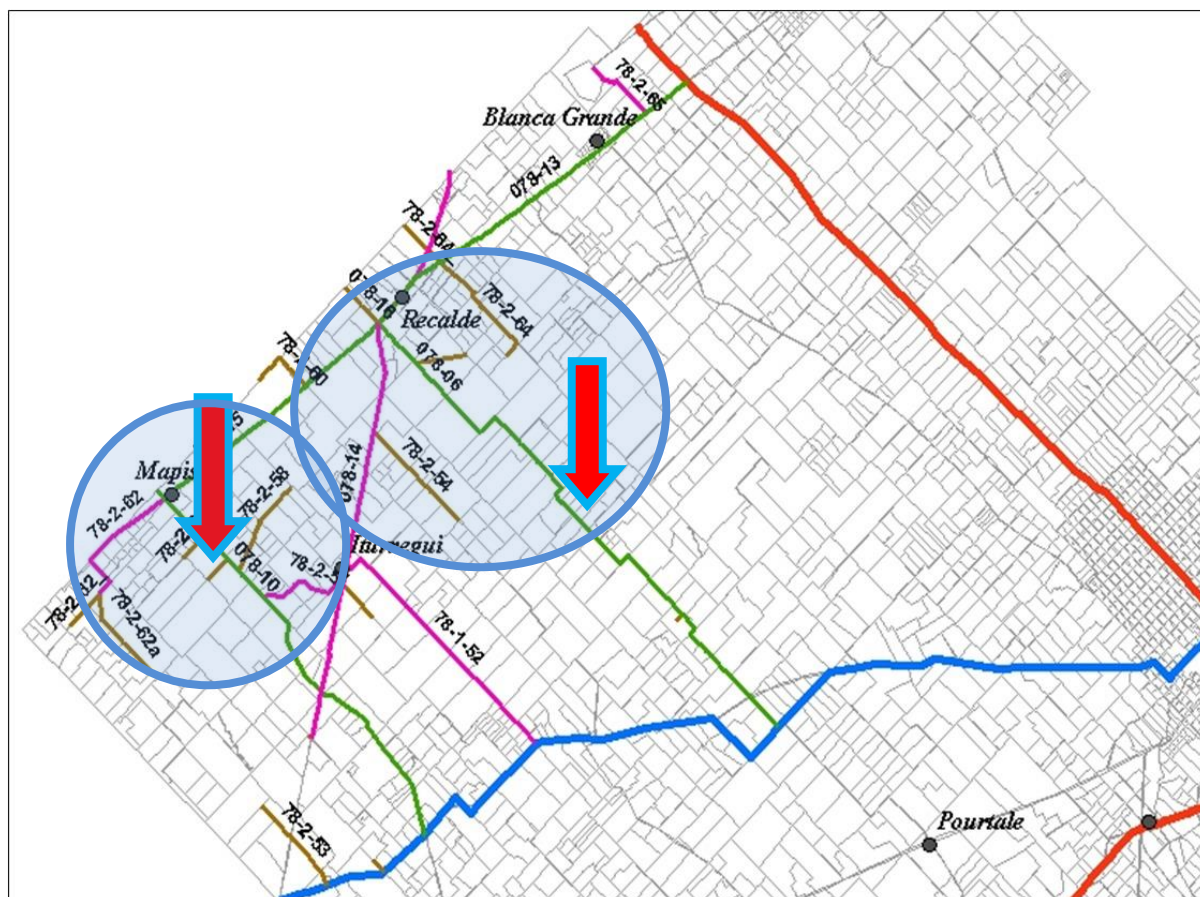


**MOTONIVELADORA 1:** Al igual que lo informado la semana pasada, este equipo continúa detenido, debido al intercambio de horas que se está realizando con retroexcavadora y camión en el camino 078-08. Posiblemente luego de finalizada esta pequeña obra el equipo vuelva a estar operativo.






**MOTONIVELADORA 2:** Este equipo continuó trabajando en la zona de Mápis. A lo largo de esta semana, en los días que se pudo trabajar, se continuó con la intervención del camino 078-15 (Recalde – Mápis) y Mápis hacia estancia La Ramona, donde recordamos que la semana pasada se aportó material en distintos pantanos que se habían formado, producto del desborde de las cunetas próximas al Quilco.

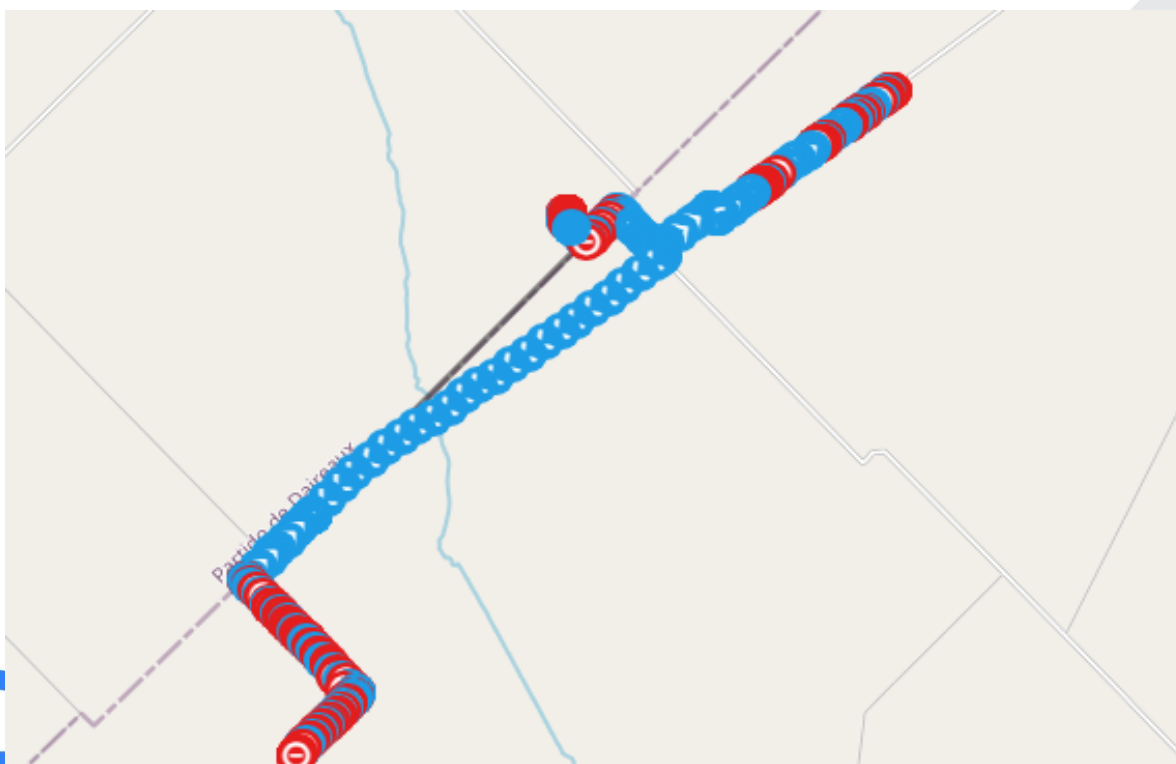

## ZONA 2

- EMPRESA CONTRATISTA: ANCAT SA

### DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

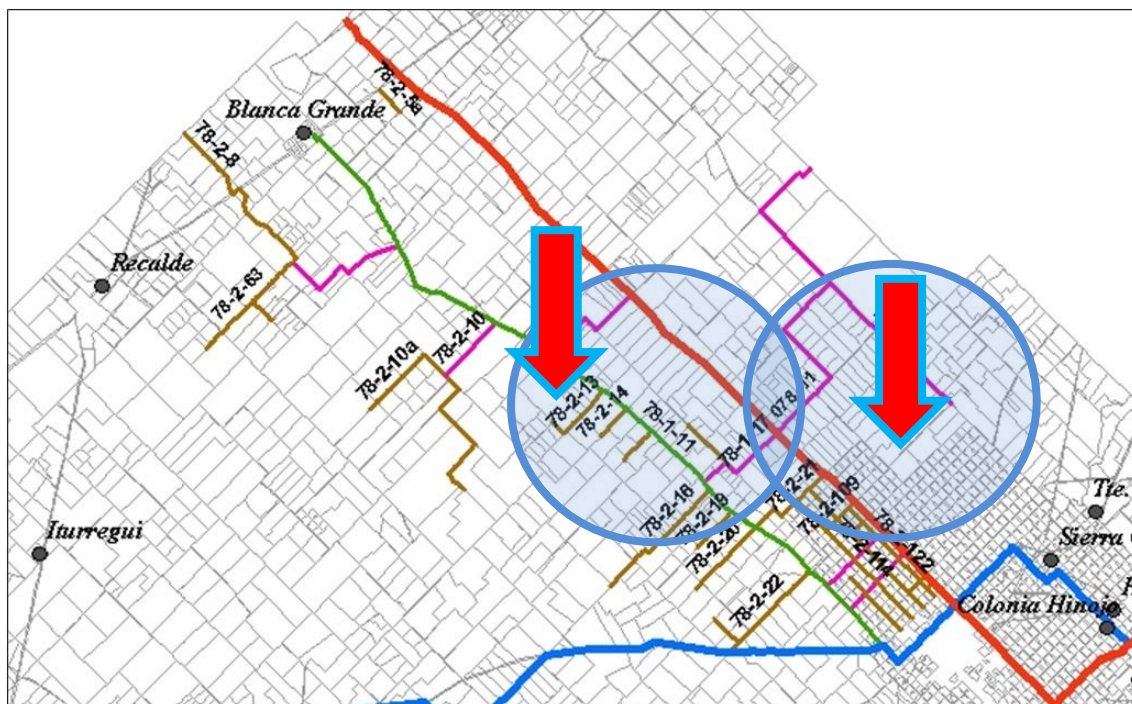

**MOTONIVELADORA 1:** A lo largo de esta semana, este equipo realizó tareas de mantenimiento rutinario en el camino 078-04 (Camino a Crotto) en el tramo próximo a ruta 226. Este camino es altamente transitado, y se observaban signos de desgaste, producto de las precipitaciones y el tránsito. Se intervino solo en las partes donde la inspección lo consideró necesario, es decir, en baches o ahuellamientos que si vuelve a llover como está anunciado la próxima semana, el efecto del agua estancada generaría complicaciones.

Además, se intervino el primer tramo del camino 78-2-24 (Camino de la Liebre), donde solo se trabajó en la reconstitución del perfil transversal en lugares puntuales, con el mismo criterio que las demás intervenciones.

Otra de las intervenciones realizadas fue en el camino 78-2-158 (La rosada – Solle) donde las precipitaciones causaron también daños importantes.



**MOTONIVELADORA 2:** Esta semana se registraron algunas complicaciones en la zona de este equipo. Luego de dos días de inactividad por lluvias, y un tercero por tramites personales del maquinista, se relevó la zona y nos encontramos con que el tramo que se había terminado la semana pasada en la zona de “Las Piedritas” está totalmente deteriorado, producto de la circulación de vehículos en días de lluvia.

Esto nos saca de cronograma, además de volver a invertir horas maquina sabiendo que pueden ser utilizadas en otro camino. Por ello, como mencione en este informe, es responsabilidad de todos cuidar los caminos, porque en este caso puntual, quien circulo y produjo estos ahuellamientos, está dejando sin poder circular al transporte escolar que lleva a los alumnos a la escuela de Las Piedritas, quienes pierden días de clase y más allá de los daños económicos, las inasistencias no se recuperan con facilidad.








## ZONA 3

- **EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES**

### DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

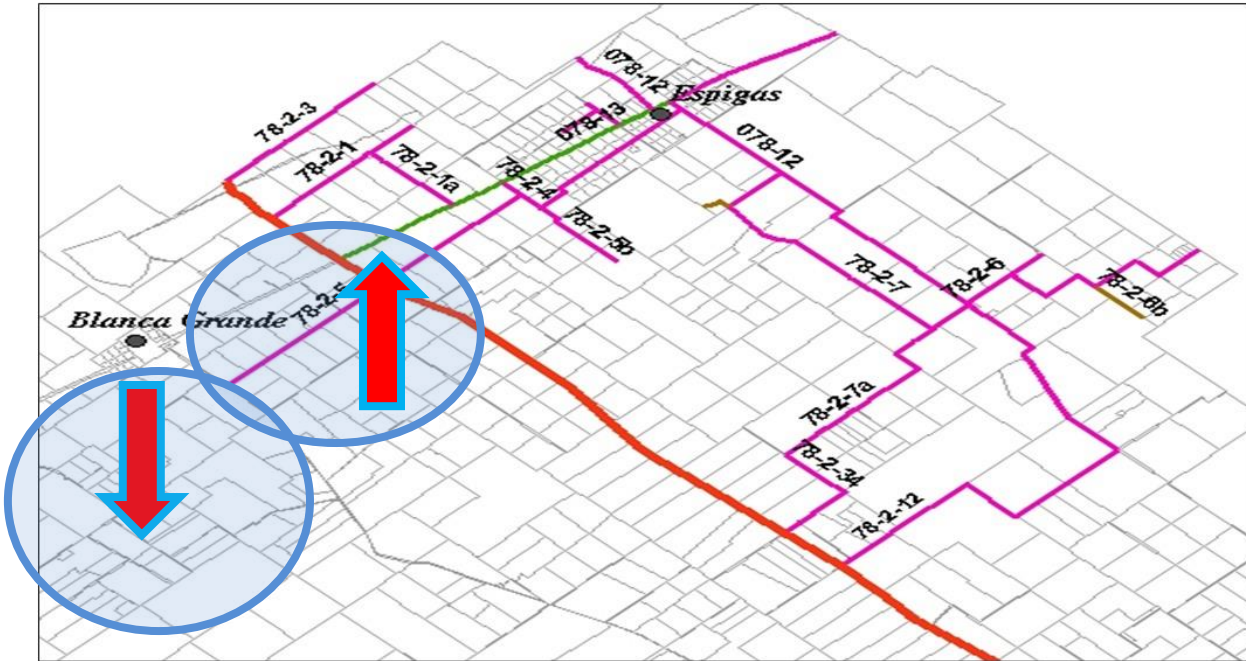

**MOTONIVELADORA 1:** A lo largo de esta semana, la motoniveladora desarrollo tareas de reconformado en el camino 078-06 (La montañesa) desde Recalde hacia la ruta 60. Ya se lograron recomponer dos tercios de la totalidad del camino, restando el tramo más complejo en cuanto a transitabilidad, llegando a la ruta 60.

Además, se realizaron tareas en el acceso a Recalde desde ruta 226.







**MOTONIVELADORA 2:** Este equipo continuo con las intervenciones puntualizadas en distintos puntos de la zona Sierra Chica – Hinojo – Colonia Hinojo.


Se intervino la zona de chacras próxima al aeródromo, la prolongación de la Av. La rioja, lindera a la fábrica Cerro negro, el desvío de camiones de Sierra Chica, la prolongación de Av. Pellegrini, el acceso a colonia Hinojo y el desvío de camiones.



## ZONA 4

- ZONA AFECTADA A MANTENIMIENTO CON EQUIPOS MUNICIPALES

### DISPOSICION DE EQUIPOS POR ZONA:

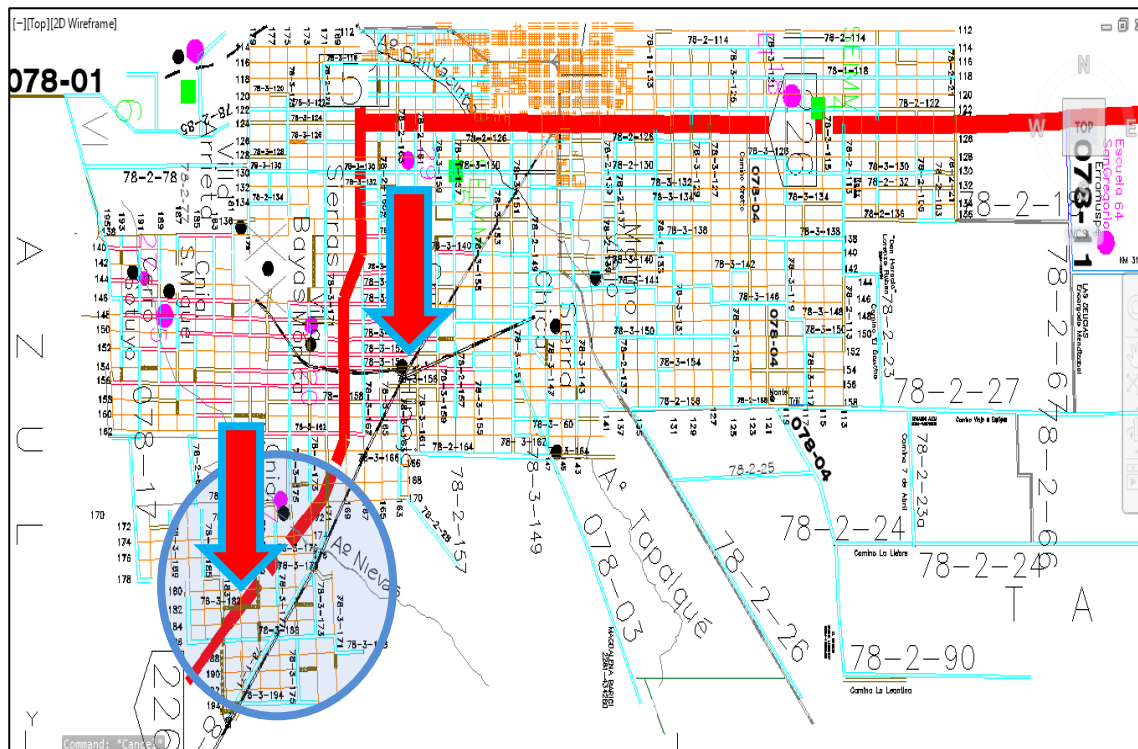

**MOTONIVELADORA 1:** Este equipo se trasladó a la zona de Colonia San Miguel y Sierras bayas, con el objetivo de ir interviniendo los sectores más afectados por las precipitaciones. Una vez concluidas las tareas en esta zona, retomaremos las actividades de aporte de estabilizado en la zona Colonia Nuevas que quedaron pendientes.

Durante esta semana se lograron pocas intervenciones, producto de las precipitaciones que en la zona fueron algo más que en el resto del partido.



**MOTONIVELADORA 2:** A lo largo de estos días, y con la comprobación de que el equipo está funcionando de manera correcta, se puede mencionar que se estuvo trabajando en un sector del camino 78-1-11 (Ruta 226 vieja, desde est. San Luis en sentido a Olavarría). Además, se pudo aportar material en un pantano que se encontraba sobre la traza del camino 78-2-117.

Además, hoy viernes se comenzó con el tratamiento de un pantano ubicado en el cruce de la prolongación de la Av. Colon y el camino que sale a la virgen de la loma. (78-3-129). Allí se está aportando material del tipo estabilizado proveniente del acuerdo con Canteras Piatti con la batea municipal.



**RETROEXCAVADORA MUNICIPAL:** Este equipo volvió a la zona 16 de julio, puntualmente al camino 78-3-37 con el objetivo de concluir las tareas iniciadas antes de las grandes precipitaciones. Con el correr de las semanas se irán informando los avances de obra.

Se puede mencionar que la semana pasada antes del traslado, se dejó un gran acopio de tosca en el camino a Kochi – Tue, con el objetivo de tener material seco cerca, para cubrir cualquier eventualidad.



Se observaron también a lo largo de la semana en dicha traza que se circuló con bastante humedad, dañando parte de los trabajos de alteo realizados en meses anteriores, por lo que se apela a la responsabilidad y al cumplimiento de la ordenanza vigente.






## ZONA 5

**EMPRESA CONTRATISTA: PRODUCCIONES INDUSTRIALES**

### DISPOSICION DE EQUIPOR POR ZONA:

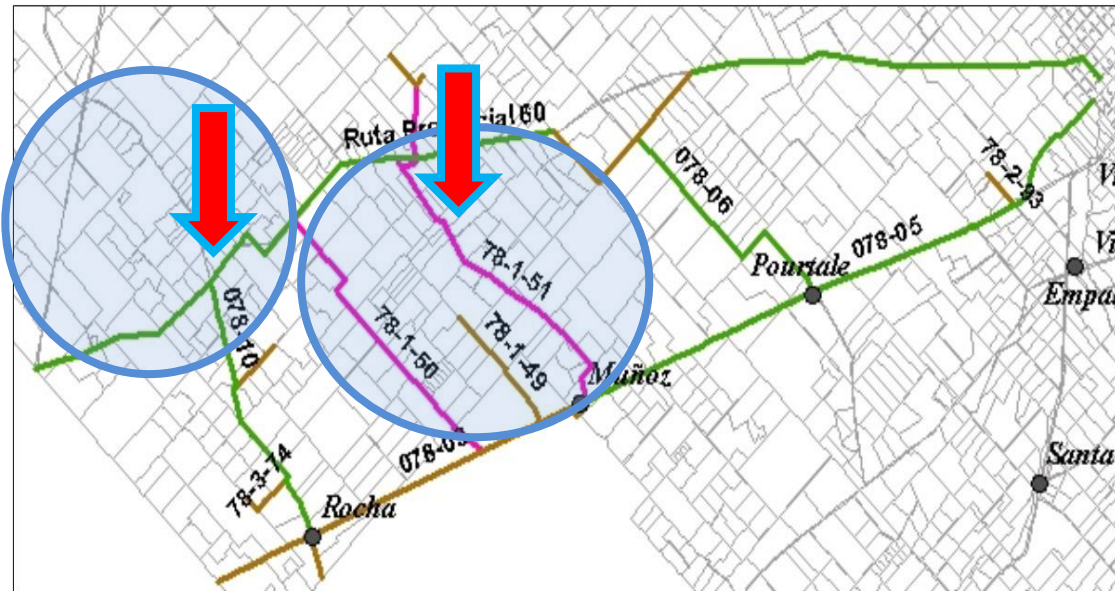

**MOTONIVELADORA 1:** Concluyeron las tareas de bacheo en el camino 78-1-51 (Muñoz – el progreso). Allí se solucionaron algunos pantanos que dificultaban la transitabilidad, aportando material con extracción lateral de la retroexcavadora sobre orugas y con camión volcador. Actualmente, el equipo de bacheo se encuentra trabajando en el camino 78-1-50 (Santa Emma) con el fin de hacer un trabajo similar al antes mencionado.

Mientras tanto, la motoniveladora concluyo las tareas pendientes sobre la traza de la ruta 60 hacia el límite del partido. Además, se trabajó sobre el camino 078-10 (Cuatro Caminos hacia Mapis) hasta el cruce de la vía, donde se espera la próxima semana ver la posibilidad de aportar material tipo estabilizado.











**MOTONIVELADORA 2:** Este equipo concluyó las tareas de mantenimiento y reconformado en el camino 078-08 (Acceso a Muñoz), solo en los tramos donde eran necesarias. Además, la inspección detectó algunas prácticas en las tareas de repaso que no concuerdan con los lineamientos de trabajo de esta dirección, por lo que se notificó a la empresa que lo repare en el corto plazo.

Posteriormente, se trasladó este equipo a la zona Muñoz-Pourtalé, sobre el camino 078-05, y Pourtalé – media estación, a fin de atacar los pantanos más complicados, en los cuales se encuentran trabajando todos los equipos y se planea continuar la próxima semana.





**MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS:** Continúan a buen ritmo las tareas de reparación, limpieza y mantenimiento de alcantarillas. Para ello se dividió el partido en dos grandes zonas, las cuales están a cargo de la empresa LECON SA.


Uno de los equipos se encuentra trabajando en la zona de Pourtalé, donde las grandes precipitaciones causaron daños en alcantarillas ya reparadas, por lo que la empresa está reconfigurando tapadas por pedido de la inspección.







El otro de los equipos se intercambió por un trabajo de bacheo en el camino 078-05 (Pourtalé – media estación) donde se continúa trabajando hasta la actualidad, y se estima poder seguir la próxima semana hasta restituir la transitabilidad en la zona.

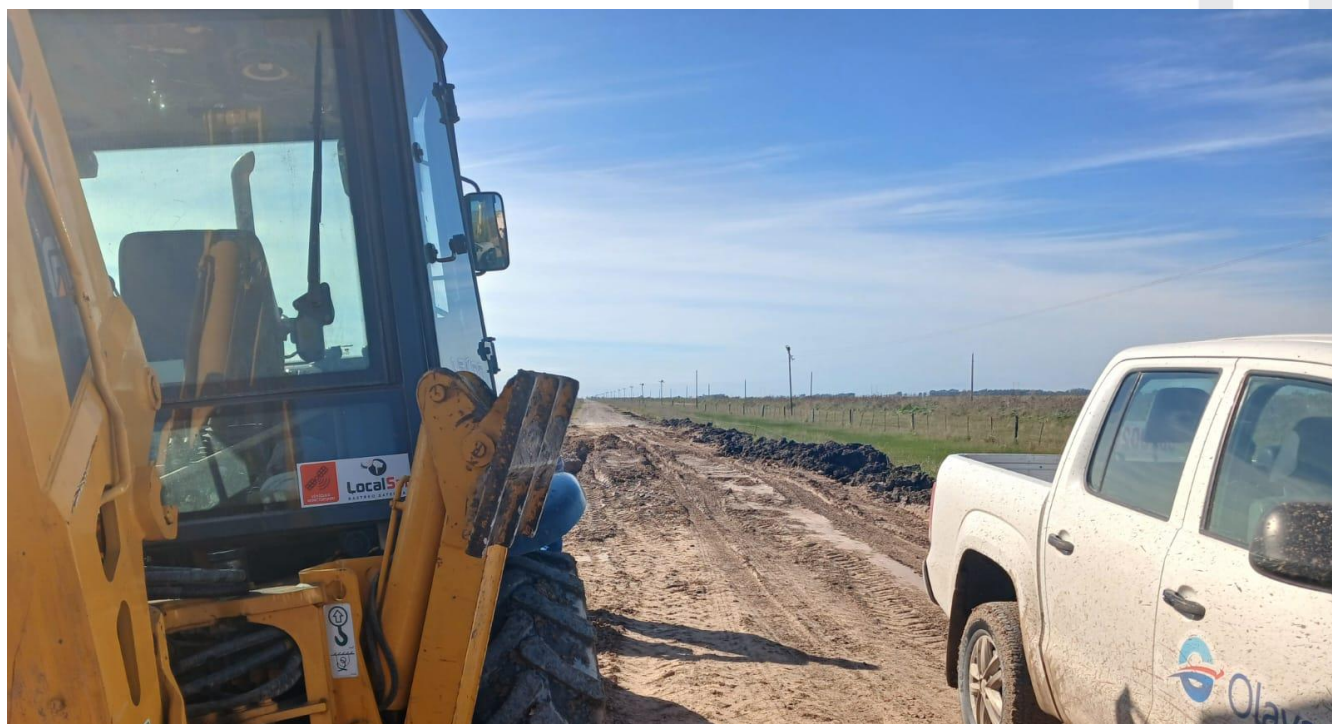

**De esta manera, la red vial del partido de Olavarría contó esta semana con 13 motoniveladoras, 5 retroexcavadoras, 3 retropalas y 5 camiones tipo tatú.**

Como siempre, cabe aclarar que hay sectores de la traza de un camino que no se intervendrán en tanto y en cuanto la inspección lo crea conveniente, dependiendo de su estado.

La dirección queda abierta a sugerencias y atenta siempre a las reflexiones que puedan surgir en cuanto a disposición de equipos o realización de tareas, a fin de garantizar la eficiencia de recursos. Además, se recuerda que ante reclamos se puede concurrir a la oficina de obras rurales en el Municipio, o bien comunicarse telefónicamente, donde alguien de nuestro equipo lo atenderá y nos pondremos en contacto para abordar la problemática.

**Saluda atte.**

**ING. Mariano Arrignon**

DIRECTOR DE OBRAS RURALES  
MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

OLAVARRIA, 9 de mayo de 2025.

